

## AVANCE DE OBRA MENSUAL

### NOVIEMBRE 2018

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día viernes 02/11/2018 en la edificación en construcción BRAVA 01, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:


- **Estructura: Finalizada.**

- **Tareas de Albañilería (mamposterías internas y externas, revoques, amurado de marcos metálicos y premarcos de aluminio, etc): en ejecución.** Mamposterías externas ejecutadas entre 1° y 8° piso (incluye revoques grueso/fino en balcones y colocación de premarcos de aluminio), en ejecución PB. Mamposterías internas ejecutadas entre 1° y 8° piso (incluye revoques gruesos en elementos estructurales/cielorrasos, grueso/fino en núcleos húmedos y colocación de marcos metálicos), en ejecución PB. Carpetas de nivelación ejecutadas entre 1° y 5° piso. Revestimiento de yeso ejecutado entre 1° y 2° piso, en ejecución en 3° piso. Tareas preliminares a revestimiento hidrófugo exterior en ejecución. Próximas tareas a realizar: Continuar con el avance de revestimiento exterior hidrófugo, ejecución de carpetas de 6° al 8° piso, ejecución de revoques en interior de baños.

- **Instalaciones (cloacales, pluviales, agua, gas, eléctricas y A°A°): en ejecución.** Instalaciones cloacales y pluviales ejecutadas entre 1° y 8° piso, en ejecución PB. Instalaciones de gas, ejecutadas entre 1° y 6° piso, en ejecución 7° piso. Instalación eléctrica (bajadas y cajas) completas entre 1° y 8° piso, en ejecución PB. Instalación de cañerías, cajas y tapas de aires acondicionados ejecutadas entre 1° y 8° piso. Próximas tareas a realizar: continuar el avance de los distintos sistemas de instalaciones.

# brava|01

Entrega: octubre 2019 / Ayacucho 54

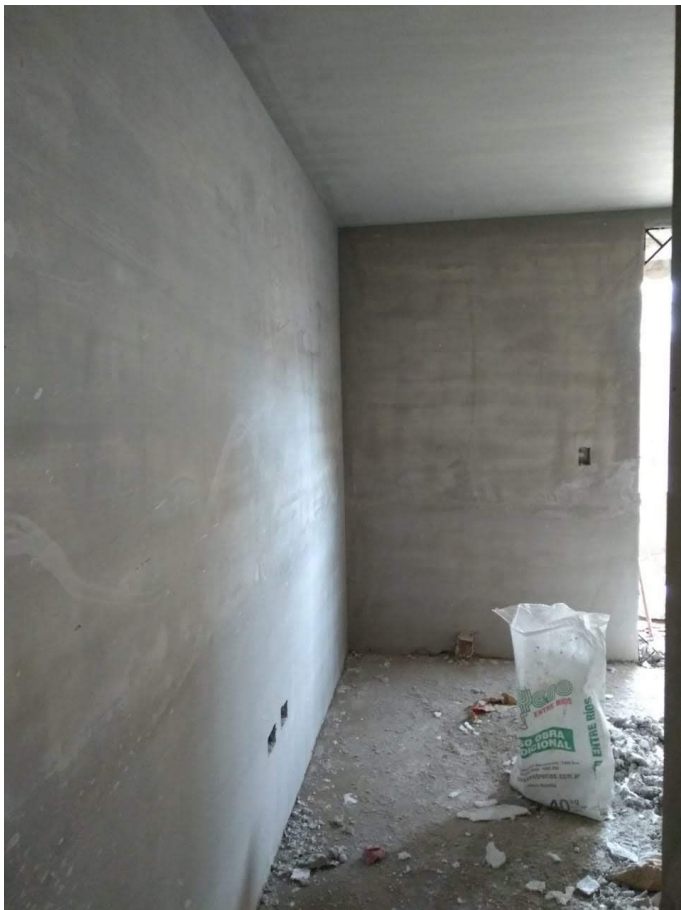

Arq. Martín Almaraz – Grupo Lofer



# brava|01

Entrega: octubre 2019 / Ayacucho 54



Arq. Martín Almaraz – Grupo Lofer
