

## AVANCE DE OBRA MENSUAL


## JULIO 2018

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día viernes 06/07/2018 en la edificación en construcción DAMAR, a continuación detallo las observaciones pertinentes:

- **Estructura: Finalizada.**
- **Tareas de Albañilería (mamposterías internas y externas, revoques, amurado de marcos metálicos y premarcos de aluminio, etc): en ejecución.** Mamposterías externas y colocación de premarcos de aluminio ejecutadas entre 1° y 15° piso, resta ejecución en planta baja y detalles en terraza. Mamposterías internas y colocación de marcos metálicos ejecutados entre 1° y 15° piso, resta ejecución en planta baja y detalles en terraza. Carpetas de nivelación ejecutadas entre 1° y 12° piso. Revestimiento de yeso ejecutado entre 1° y 12° piso, en ejecución en 13°, 14° y 15° piso. Revestimiento cerámico en baños y cocinas ejecutados entre 1° y 12° piso, en ejecución en 13° piso. Revestimiento cerámico en balcones ejecutado entre 1° y 12° piso, en ejecución en 13° piso. Revestimiento de porcelanato ejecutado entre 2° y 8° piso, en ejecución en 9° piso. Próximas tareas a realizar: colocación de membranas hidrófugas en azotea y terrazas, continuar con el avance en colocación de cerámicos y porcelanatos en paredes y pisos de departamentos.
- **Instalaciones (cloacales, pluviales, agua, gas, eléctricas y A°A°): en ejecución.** Instalaciones cloacales y pluviales ejecutadas entre 1° y 15° piso, resta ejecución en planta baja. Instalaciones de gas ejecutadas en 1° y 14° piso, resta ejecución en planta baja. Instalaciones eléctricas ejecutadas entre 1° y 15° piso (cañería, bocas y cajas), resta ejecución en planta baja. Ventilaciones ejecutadas hasta azotea. Instalaciones de A°A° ejecutadas entre 1° y 14° piso. Próximas tareas a realizar: continuar el avance de los distintos sistemas de instalaciones.

NVA  
CBA

D  
A  
M  
A  
R  
By ILLIA 518

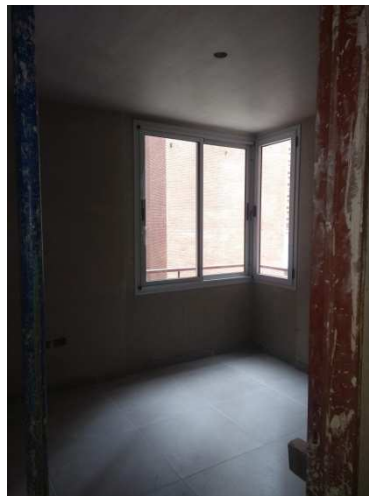

Arq. Martín Almaraz – Grupo Lofer

grupoloferr



NVA  
CBA

D  
A  
M  
A  
R  
By ILLIA 518



Arq. Martín Almaraz – Grupo Lofer

grupolofer
