

AVANCE DE OBRA MENSUAL

OCTUBRE 2018

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día Lunes 15/10/2018 en la edificación en construcción DAMAR, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

- **Estructura: Finalizada.**
- **Tareas de Albañilería (mamposterías internas y externas, revoques, amurado de marcos metálicos y premarcos de aluminio, etc): en ejecución.** Mamposterías externas y colocación de premarcos de aluminio finalizadas. Mamposterías internas y colocación de marcos metálicos finalizadas. Carpetas de nivelación finalizadas. Revestimiento de yeso finalizado. Revestimiento cerámico en baños y cocinas ejecutados entre 1° y 15° piso, en ejecución en Local Comercial. Revestimiento cerámico en balcones finalizado. Revestimiento de porcelanato ejecutado entre 1° y 15° piso, en ejecución en Planta Baja. Muebles bajo mesada instalados entre 2° y 13°, mármoles en mesadas instalados entre el 2° y 8° piso, alacenas instaladas entre 2° y 8° piso. Frentes e interiores de placares instalados entre 2° y 8° piso. Colocación de espejos y mamparas en balcones finalizados. Trabajos de pintura en interior de departamentos en ejecución entre 1° y 15° piso con un avance del 75%. Trabajos de impermeabilización exterior de ladrillo visto en fachadas y patios internos en ejecución con un avance del 80%. Próximas tareas a realizar: continuar con el avance de trabajos de terminaciones en ejecución y colocación de herrajes.
- **Instalaciones (cloacales, pluviales, agua, gas, eléctricas y A°A°): en ejecución.** Instalaciones cloacales y pluviales finalizadas. Instalaciones de gas finalizadas (incluye cuadro de regulación en planta baja). Cableado interno de departamentos ejecutado entre 1° y 12° piso, en ejecución en 13° piso. Cableado de montante eléctrica general del edificio ejecutado entre 1° y 14° piso, en ejecución en 15° piso. Instalación de artefactos de iluminación ejecutada entre 2° y 5° piso, en ejecución en 6° piso. Instalaciones de A°A° finalizadas. Artefactos sanitarios y griferías instalados entre 2° y 9° piso, en ejecución en 10° piso. Próximas tareas a realizar: continuar el avance de los distintos sistemas de instalaciones.

NVA
CBA

D
A
M
A
R
By Lilia 518




Arq. Martín Almaraz – Grupo Lofer

grupolofer 

NVA
CBA

D
A
M
A
R
By ILLIA 518

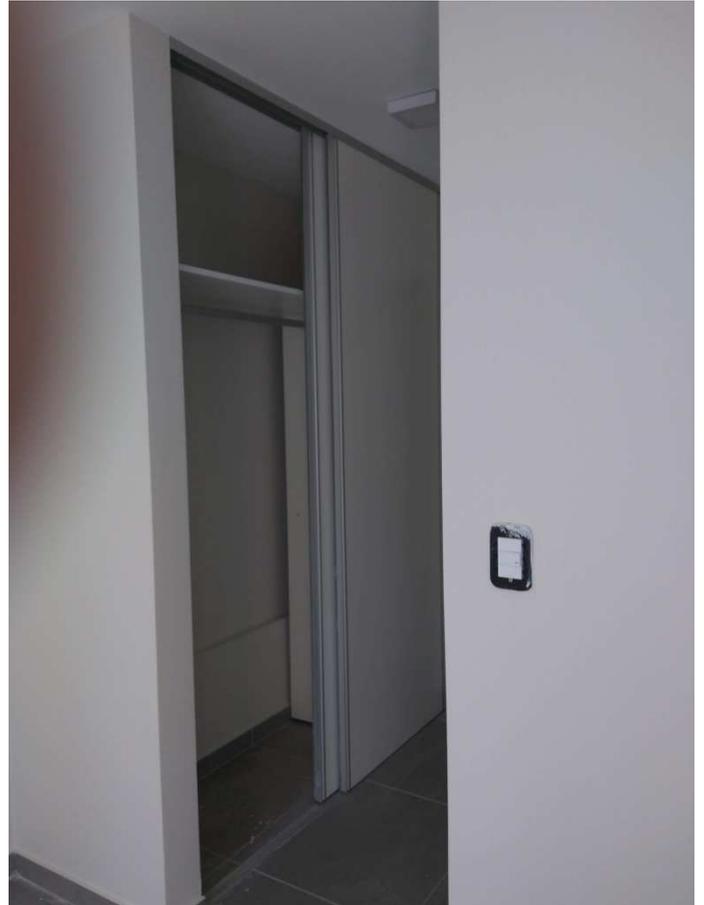

Arq. Martín Almaraz – Grupo Lofer

grupolofe 

NVA
CBA



D
A
M
A
R

By ILLIA 518



Arq. Martín Almaraz – Grupo Lofer

grupolofer
