


INFORME AVANCE MENSUAL DE OBRA JUNIO 2020


Avance de Ventas

- Unidades Vendidas
- Unidades Disponibles




Avance Total de Obra

- Tareas Ejecutadas
- Tareas Pendientes



Avance de Obra por Rubros

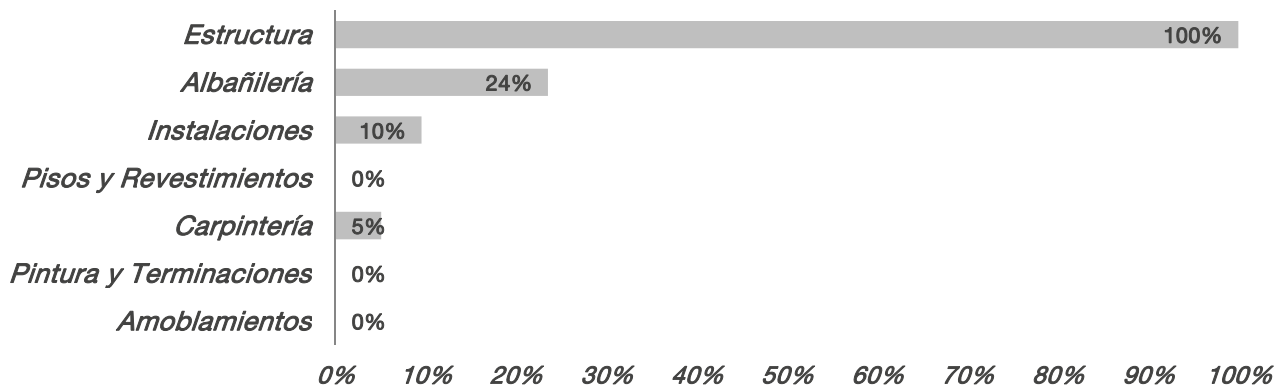

Estimados clientes, tenemos el agrado de comunicarles que tras realizar las gestiones correspondientes y proveer a las obras de los insumos de prevención, protección y desinfección exigidos el protocolo desarrollado para obras privadas dentro de la Ciudad de Córdoba, hemos retomado las actividades en la obra L154 desde el día 10 de Junio tras recibir la autorización de la Municipalidad de Córdoba.

A modo de recordatorio, previo al comienzo de la cuarentena, la Estructura se ejecutó en su totalidad, mientras que los trabajos llevados adelante en ese momento se concentraban en Albañilería e Instalaciones. Se ejecutaron mamposterías internas entre Planta Baja y 4° Piso, incluyendo amurado de marcos metálicos, revoques gruesos en cielorraso y revoques gruesos y finos en núcleos húmedos. Las mamposterías externas se ejecutaron hasta 6° Piso, incluyendo amurado de premarcos de aluminio. En paralelo, se ejecutaron Instalaciones Sanitarias y de Gas entre Planta Baja y 2° Piso, con avances parciales en 3° Piso, mientras que se realizaron tendidos de Instalaciones Eléctricas entre 1° y 2° Piso.

Continuaremos con firmeza el avance de las obras, respetando los protocolos de sanidad exigidos por los organismos de control, para el cuidado no solo de nuestro equipo de trabajo y clientes sino también aportando nuestro compromiso para con la ciudadanía en su conjunto.



