


INFORME AVANCE MENSUAL DE OBRA JUNIO 2020


Avance de Ventas

- Unidades Vendidas
- Unidades Disponibles




Avance Total de Obra

- Tareas Ejecutadas
- Tareas Pendientes



Avance de Obra por Rubros

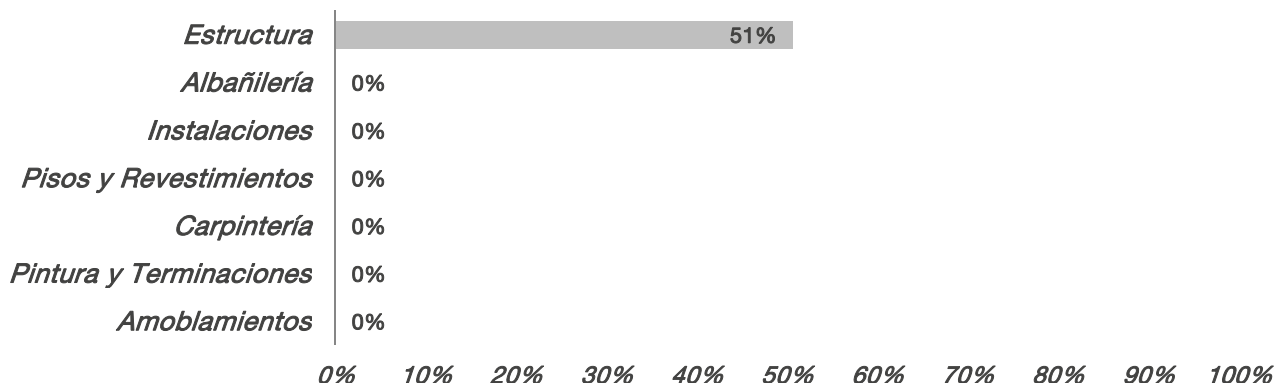

Estimados clientes, tenemos el agrado de comunicarles que tras realizar las gestiones correspondientes y proveer a las obras de los insumos de prevención, protección y desinfección exigidos por el protocolo desarrollado para obras privadas dentro de la Ciudad de Córdoba, hemos retomado las actividades en la obra PAMPA 8 desde el día 10 de Junio tras recibir la autorización de la Municipalidad de Córdoba.

A modo de recordatorio, los trabajos en ejecución previos al comienzo de la cuarentena se centraban en la Estructura, puntualmente en la ejecución de la losa sobre 6° Piso, la cual se está hormigonando el día de hoy. En paralelo, con el avance en la ejecución de losas, se realizaron los tendidos de Instalaciones Eléctricas que incluyen colocación de cajas, bocas y caños corrugados. En lo que respecta a fundaciones y subsuelo técnico, fueron ejecutados en su totalidad.

Continuaremos con firmeza el avance de las obras, respetando los protocolos de sanidad exigidos por los organismos de control, para el cuidado no solo de nuestro equipo de trabajo y clientes sino también aportando nuestro compromiso para con la ciudadanía en su conjunto.



