


INFORME AVANCE MENSUAL DE OBRA AGOSTO 2020


Avance de Ventas

- Unidades Vendidas
- Unidades Disponibles




Avance Total de Obra

- Tareas Ejecutadas
- Tareas Pendientes



Avance de Obra por Rubros

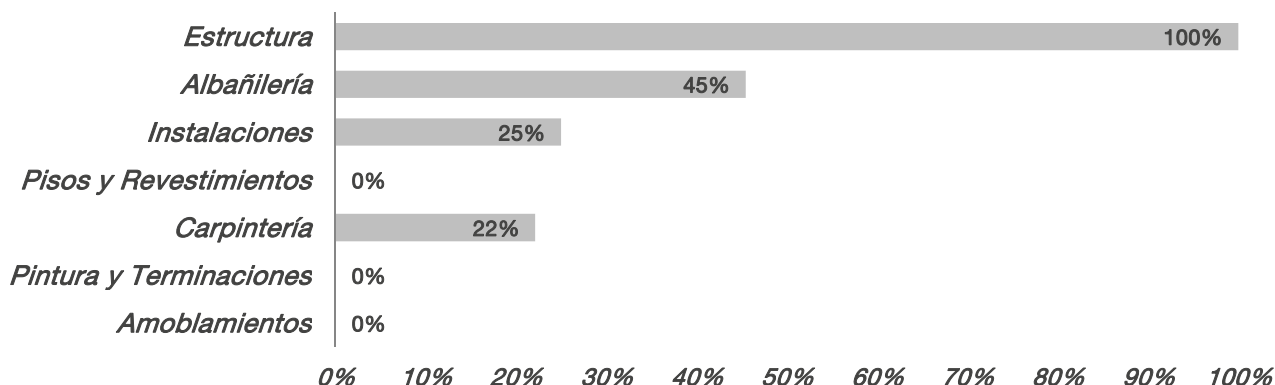

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día Viernes 21/08/2020 en la edificación en construcción L154, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

■ **Estructura: FINALIZADA**

■ **Tareas de Albañilería y Terminación: EN EJECUCIÓN**

- Mamposterías internas (incluye revoques gruesos en elementos estructurales/cielorrasos, grueso/fino en núcleos húmedos y colocación de marcos metálicos): ejecutadas entre Planta Baja y 8° Piso, en ejecución en 9° Piso. Mamposterías externas (incluye colocación de premarcos de aluminio): ejecutadas entre 1° y 9° Piso, en ejecución en 10° Piso. Carpetas de nivelación ejecutadas entre 1° y 7° Piso. Revestimiento de yeso en ejecución entre 1° y 2° Piso.
- Próximas tareas a realizar: Continuar el avance de tareas de mamposterías internas y externas, carpetas de nivelación y revestimiento de yeso.

■ **Instalaciones Sanitarias, Agua, Gas, Eléctricas y Aire Acondicionado: EN EJECUCIÓN**

- Instalación cloacal: en interior de departamentos ejecutada entre 1° y 7° piso (incluye vinculación a cañería montante vertical de cloaca).

- Instalación de agua: en interior de departamentos ejecutada entre Planta Baja y 7° piso (incluye vinculación a cañería montante vertical de agua).
- Instalación pluvial: en interior de departamentos ejecutada entre Planta baja y 7° piso (incluye vinculación a cañería montante vertical pluvial).
- Instalación eléctrica: tendido cañerías corrugadas y cajas en losas finalizadas. Bajadas de caño corrugado, cajas y bocas de iluminación ejecutadas entre 1° y 6° piso.
- Próximas tareas a realizar: continuar el avance de los sistemas de instalaciones.





