


INFORME AVANCE MENSUAL DE OBRA
AGOSTO 2020


Avance de Ventas

- Unidades Vendidas
- Unidades Disponibles




Avance Total de Obra

- Tareas Ejecutadas
- Tareas Pendientes



Avance de Obra por Rubros

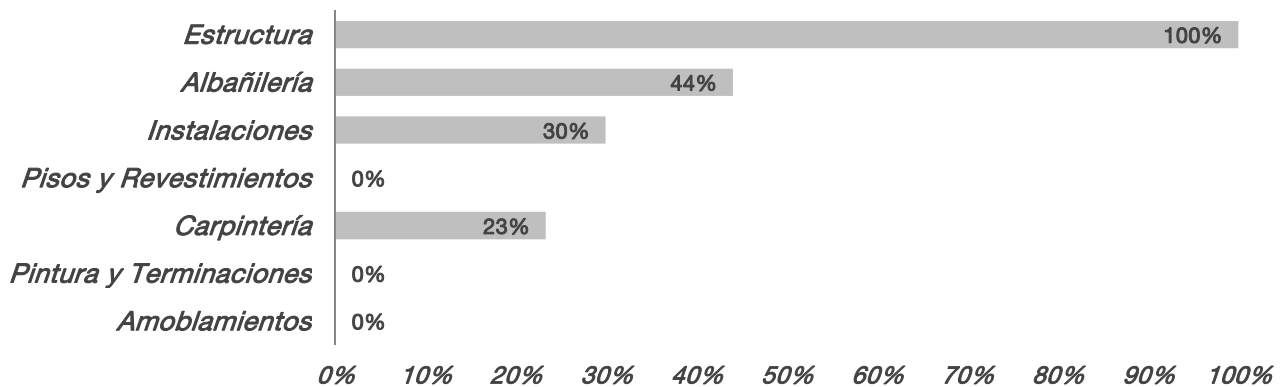

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día Viernes 21/08/2020 en la edificación en construcción MAGNA 9, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

- **Estructura: FINALIZADA**
- **Tareas de Albañilería y Terminación: EN EJECUCIÓN**
 - Mamposterías externas (incluye colocación de premarcos de aluminio): ejecutada entre 1° y 6° Piso, en ejecución en 7° Piso.
 - Mamposterías internas (incluye revoques gruesos en elementos estructurales/cielorrasos, grueso/fino en núcleos húmedos y colocación de marcos metálicos): ejecutadas entre 1° y 6° Piso, en ejecución en 7° Piso.
 - Próximas tareas a realizar: Continuar el avance de tareas de mamposterías internas, externas, colocación de marcos de chapa y premarcos de aluminio.
- **Instalaciones Sanitarias, Agua, Gas, Eléctricas y Aire Acondicionado: EN EJECUCIÓN**
 - Instalación cloacal: en interior de departamentos ejecutada entre 1° y 4° piso (incluye vinculación a cañería montante vertical de cloaca).

- Instalación de agua: en interior de departamentos ejecutada entre 1° y 4° piso (incluye vinculación a cañería montante vertical de agua).
- Instalación pluvial: en interior de departamentos ejecutada entre 1° y 4° piso (incluye vinculación a cañería montante vertical pluvial).
- Instalación de gas: en interior de departamentos ejecutada entre 1° y 4° piso (cañería montante vertical de gas sin ejecutar).
- Instalación eléctrica: tendido cañerías corrugadas y cajas en losas finalizadas. Bajadas de caño corrugado, cajas y bocas de iluminación ejecutadas entre 1° y 5° piso.
- Próximas tareas a realizar: continuar el avance de los sistemas de instalaciones.

