


JUNIO 2023


Avance de Ventas

- Unidades Vendidas
- Unidades Disponibles




Avance Total de Obra

- Tareas Ejecutadas
- Tareas Pendientes



Avance de Obra por Rubros

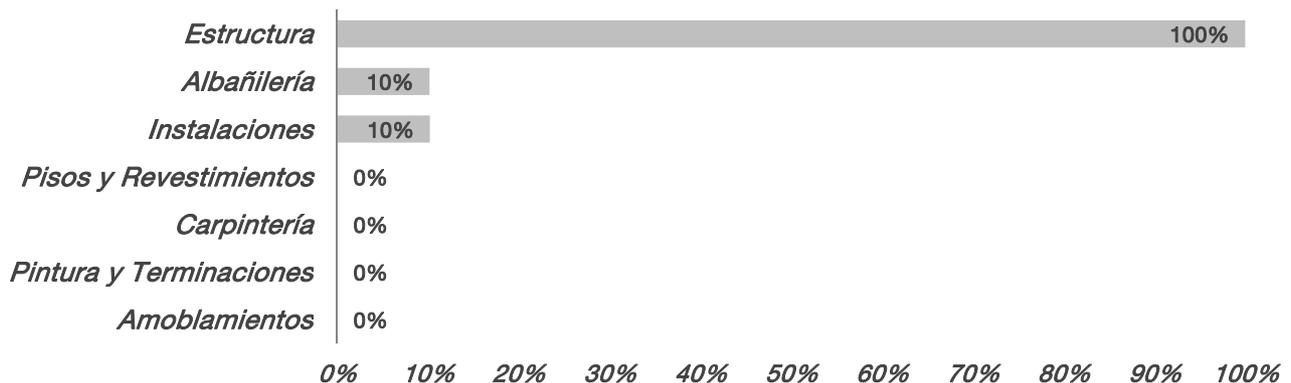

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día Miércoles 05/07/2023 en la edificación en construcción MAGNA 10, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

- **Estructura: FINALIZADA**
- **Tareas de Albañilería y Terminación: EN EJECUCIÓN**
 - Mamposterías externas (incluye colocación de premarcos de aluminio): ejecutada entre 1 y 5° Piso, en ejecución en 6° Piso.
 - Mamposterías internas (incluye revoques gruesos en elementos estructurales/cielorrasos, grueso/fino en núcleos húmedos y colocación de marcos metálicos): frentes ejecutados entre 2° y 4° Piso, en ejecución en 5° Piso.
 - Próximas tareas a realizar: continuar con el avance en la ejecución de mamposterías externas e internas.

■ **Instalaciones Sanitarias, Agua, Gas, Eléctricas y Aire Acondicionado: EN EJECUCIÓN**

- Instalación pluvial: en interior de departamentos ejecutada entre 1° y 4° piso (incluye vinculación a cañería montante vertical de agua).
- Instalación eléctrica: tendido cañerías corrugadas y cajas en losas finalizado.
- Próximas tareas a realizar: continuar avance de instalaciones pluviales, ejecución de instalaciones eléctricas e iniciar trabajos de instalaciones cloacales.

