


FEBRERO 2025


## Avance de Ventas

- Unidades Vendidas
- Unidades Disponibles




## Avance Total de Obra

- Tareas Ejecutadas
- Tareas Pendientes



## Avance de Obra por Rubros

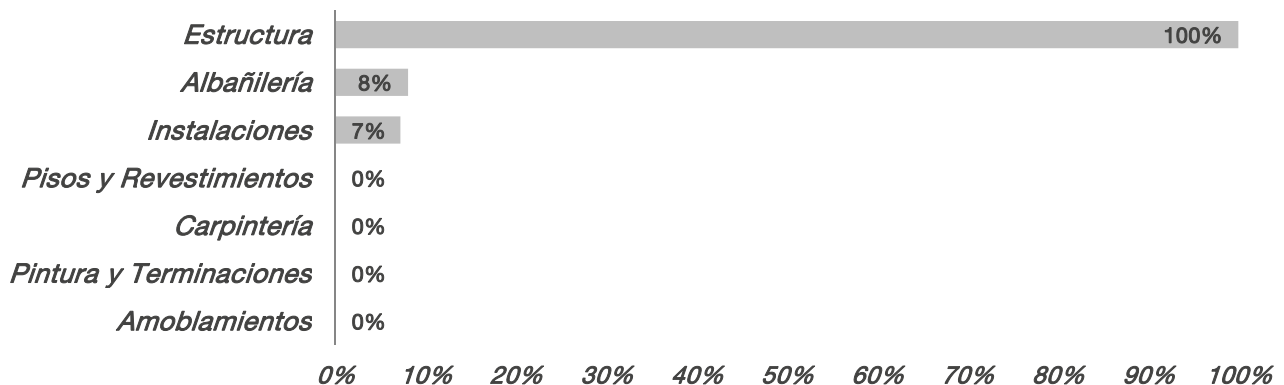

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día Lunes 10/03/2025 en la edificación en construcción BRAVA 3, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

- **Estructura: FINALIZADA**
- **Tareas de Albañilería y Terminación: EN EJECUCIÓN**
  - Mamposterías externas (incluye colocación de premarcos de aluminio): ejecutada entre 1° y 2° Piso, en ejecución 3° Piso.
  - Mamposterías internas (incluye revoques gruesos en elementos estructurales/cielorrasos, grueso/fino en núcleos húmedos y colocación de marcos metálicos): ejecutada en 1° Piso, en ejecución 2° y 3° Piso.
  - Próximas tareas a realizar: continuar con el avance en la ejecución de mamposterías externas e internas.

■ **Instalaciones Sanitarias, Agua, Gas, Eléctricas y Aire Acondicionado: EN EJECUCIÓN**

- Instalación eléctrica: tendido cañerías corrugadas y cajas en losas finalizado.
- Próximas tareas a realizar: iniciar con trabajos de instalaciones pluviales, agua preliminar de obra y continuar con el avance de instalaciones eléctricas.





