


MARZO 2025


## Avance de Ventas

- Unidades Vendidas
- Unidades Disponibles




## Avance Total de Obra

- Tareas Ejecutadas
- Tareas Pendientes



## Avance de Obra por Rubros

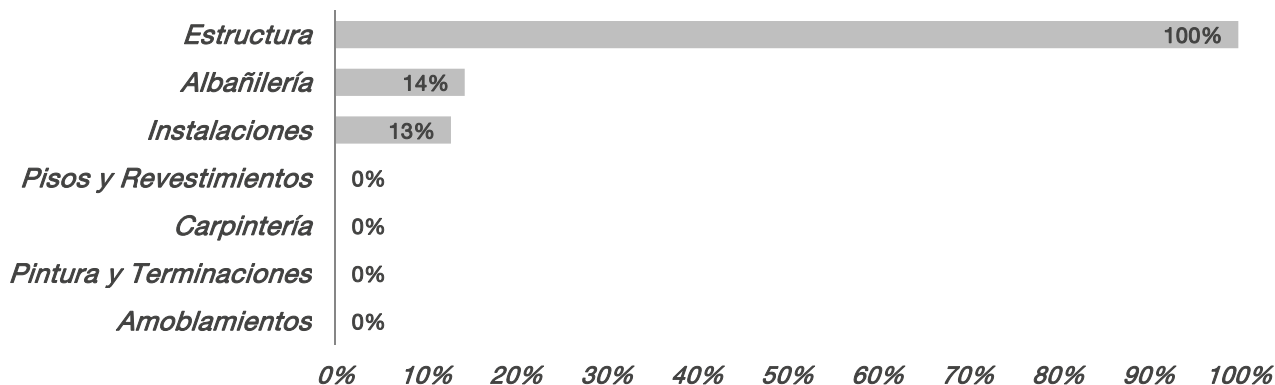

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día Martes 08/04/2025 en la edificación en construcción BRAVA 3, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

■ **Estructura: FINALIZADA**

■ **Tareas de Albañilería y Terminación: EN EJECUCIÓN**

- Mamposterías externas (incluye colocación de premarcos de aluminio): ejecutada entre 1° y 4° Piso, en ejecución 5° Piso.
- Mamposterías internas (incluye revoques gruesos en elementos estructurales/cielorrasos, grueso/fino en núcleos húmedos y colocación de marcos metálicos): ejecutada entre 1° y 3° Piso, en ejecución 4° Piso.
- Próximas tareas a realizar: continuar con el avance en la ejecución de mamposterías externas e internas.

- **Instalaciones Sanitarias, Agua, Gas, Eléctricas y Aire Acondicionado: EN EJECUCIÓN**
  - Instalación cloacal: en interior de departamentos en ejecución entre 1° y 2° Piso (incluye ejecución y vinculación a cañería montante vertical de agua).
  - Instalación de agua: en interior de departamentos en ejecución entre 1° y 2° Piso (incluye ejecución y vinculación a cañería montante vertical de agua).
  - Instalación eléctrica: tendido cañerías corrugadas y cajas en losas finalizado. Bajadas de caño corrugado, cajas y bocas de iluminación en ejecución 2° Piso.
  - Próximas tareas a realizar: continuar avance de instalaciones sanitarias y ejecución de instalaciones eléctricas.









