


ABRIL 2025


Avance de Ventas

- Unidades Vendidas
- Unidades Disponibles




Avance Total de Obra

- Tareas Ejecutadas
- Tareas Pendientes



Avance de Obra por Rubros

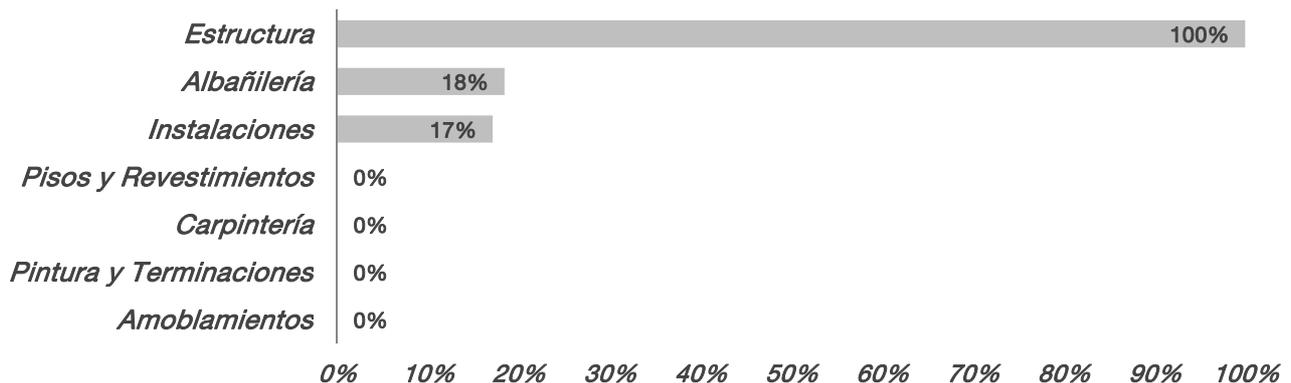

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día Miércoles 07/05/2025 en la edificación en construcción BRAVA 3, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

- **Estructura: FINALIZADA**
- **Tareas de Albañilería y Terminación: EN EJECUCIÓN**
 - Mamposterías externas (incluye colocación de premarcos de aluminio): ejecutada entre 1° y 5° Piso, en ejecución 6° Piso.
 - Mamposterías internas (incluye revoques gruesos en elementos estructurales/cielorrasos, grueso/fino en núcleos húmedos y colocación de marcos metálicos): ejecutada entre 1° y 4° Piso, en ejecución 5° Piso.
 - Próximas tareas a realizar: continuar con el avance en la ejecución de mamposterías externas e internas.

- **Instalaciones Sanitarias, Agua, Gas, Eléctricas y Aire Acondicionado: EN EJECUCIÓN**
 - Instalación cloacal: en interior de departamentos en ejecutada entre 1° y 3° Piso, en ejecución 4° Piso (incluye ejecución y vinculación a cañería montante vertical de agua).
 - Instalación de agua: en interior de departamentos en ejecución entre 1° y 3° Piso, en ejecución 4° Piso (incluye ejecución y vinculación a cañería montante vertical de agua).
 - Instalación eléctrica: tendido cañerías corrugadas y cajas en losas finalizado. Bajadas de caño corrugado, cajas y bocas de iluminación ejecutadas entre 2° y 3° Piso, en ejecución 4° Piso.
 - Próximas tareas a realizar: continuar avance de instalaciones sanitarias y ejecución de instalaciones eléctricas.



