


MAYO 2025


Avance de Ventas

- Unidades Vendidas
- Unidades Disponibles




Avance Total de Obra

- Tareas Ejecutadas
- Tareas Pendientes



Avance de Obra por Rubros

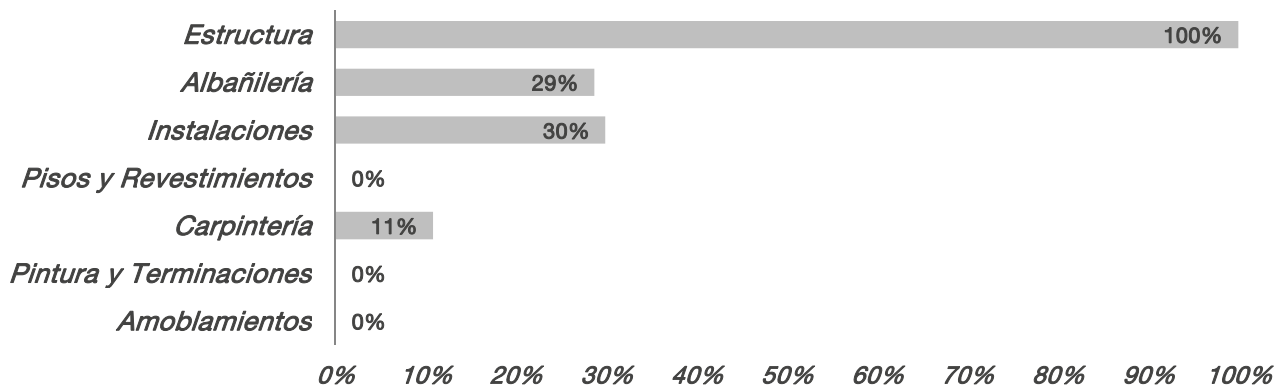

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día Jueves 12/06/2025 en la edificación en construcción BRAVA 3, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

■ Estructura: **FINALIZADA**

■ Tareas de Albañilería y Terminación: **EN EJECUCIÓN**

- Mamposterías externas (incluye colocación de premarcos de aluminio): ejecutada entre 1° y 8° Piso, en ejecución 9° Piso.
- Mamposterías internas (incluye revoques gruesos en elementos estructurales/cielorrasos, grueso/fino en núcleos húmedos y colocación de marcos metálicos): ejecutada entre 1° y 7° Piso, en ejecución 8° Piso.
- Carpetas de nivelación: ejecutada entre 1° y 6° Piso.
- Revestimiento de yeso: en ejecución entre 2° y 3° Piso.
- Próximas tareas a realizar: continuar con el avance en la ejecución de mamposterías externas e internas.

- **Instalaciones Sanitarias, Agua, Gas, Eléctricas y Aire Acondicionado: EN EJECUCIÓN**
 - Instalación cloacal: en interior de departamentos ejecutada entre 1° y 6° Piso, en ejecución 7° Piso (incluye ejecución y vinculación a cañería montante vertical de agua).
 - Instalación de agua: en interior de departamentos ejecutada entre 1° y 6° Piso, en ejecución 7° Piso (incluye ejecución y vinculación a cañería montante vertical de agua).
 - Instalación eléctrica: tendido cañerías corrugadas y cajas en losas finalizado. Bajadas de caño corrugado, cajas y bocas de iluminación ejecutadas entre 2° y 6° Piso, en ejecución 7° Piso.
 - Instalación de aire acondicionado: ejecutada entre 1° y 6° Piso.
- Próximas tareas a realizar: continuar avance de instalaciones sanitarias, ejecución de instalaciones eléctricas y de aire acondicionado.

