


JUNIO 2025


Avance de Ventas

- Unidades Vendidas
- Unidades Disponibles




Avance Total de Obra

- Tareas Ejecutadas
- Tareas Pendientes



Avance de Obra por Rubros

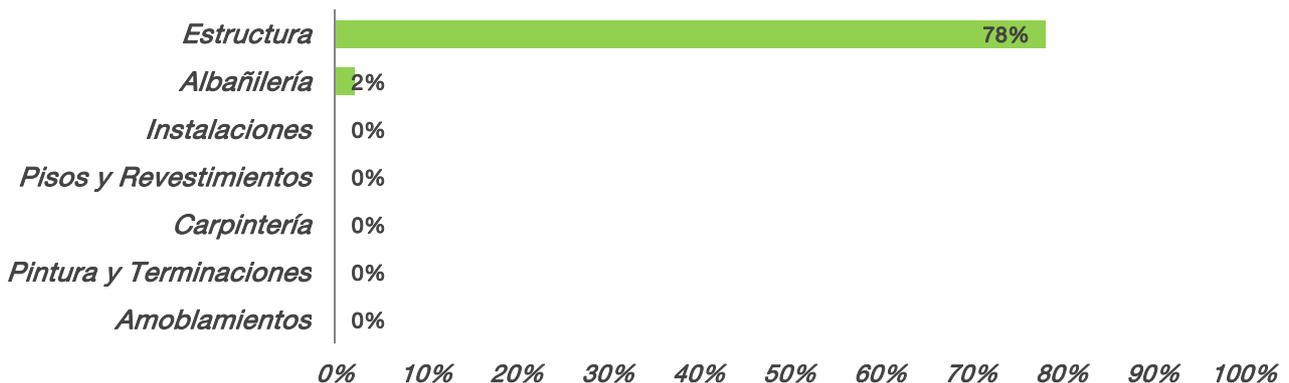

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día Viernes 18/07/2025 en la edificación en construcción MAGNA 11, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

■ Estructura: **EN EJECUCIÓN**

- Fundaciones: *Finalizada*
- Estructura de elevación (incluye losas, columnas, vigas y tabiques): losa sobre Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° Piso finalizadas. Losa sobre 8° Piso en ejecución.
- Próximas tareas a realizar: continuar con el avance en la ejecución de losas, columnas, vigas y tabiques que conforman la estructura.

■ Tareas de Albañilería y Terminación: **EN EJECUCIÓN**

- Mamposterías externas (incluye colocación de premarcos de aluminio): en ejecución tareas preliminares para inicio de trabajos.
- Mamposterías internas (incluye revoques gruesos en elementos estructurales/cielorrasos, grueso/fino en núcleos húmedos y colocación de marcos metálicos): en ejecución 1° Piso.





